


スリランカ・キャンディ



出典:世界地図・SekaiChizu
(<http://www.sekaichizu.jp/>)



出展: Provincial Road Development Authority – Central Province

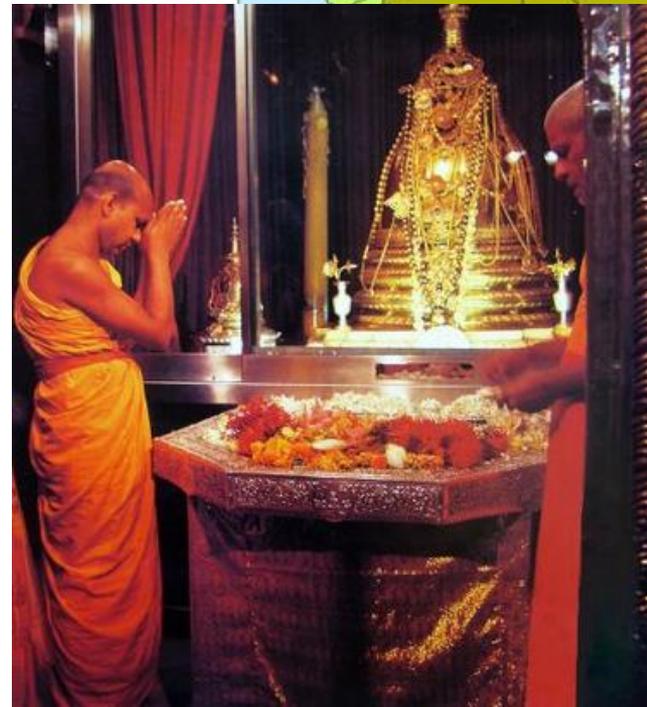

nd
OS Divisions
Lower Ebiya District (8)
Nakale District (8)
Kandy District (17)

tion & Health

事業スケジュール

2013年7月31日仮契約

2014年

スリランカ政府発行契約書類
外注先見積作成
予算書作成

事業内容

1. プラントの設置・稼働指導
2. 報告書の作成
3. 日本への視察団受け入れ

2015年

2015年1月23日本契約

2015年2月6日まで事業計画書作成

機械
製作

来日

2015年10月31日までに第1回中間報告書作成

据付

竣工式

2016年4月30日までに第2回中間報告書作成

2016年11月10日までに業務完了報告書作成

2016年

2017年



2015年1月28日 ステークホルダー
ミーティング口



2015年1月28日 ミニッツ サイン口

JICA本契約2015.1.23.

スリランカ役所現地契約
住民説明会2015.1.28.



2015年3月9日 起工式口



2015年3月9日 建設地全景口

スリランカ現地起工式
2015.3.9.

現地建設開始
2015.3.9～



2015年5月12日 本邦受入活動
栗駒有機センター トレーニング口



2015年6月12日 現地工場整地作業状況口

地盤改良の必要性が発覚
2015.6.1.～

工期3ヶ月遅延

本邦受入活動
2015.5.12.
